




**2016 YILI
YATIRIM PROGRAMI İZLEME
VE DEĞERLENDİRME
RAPORU**

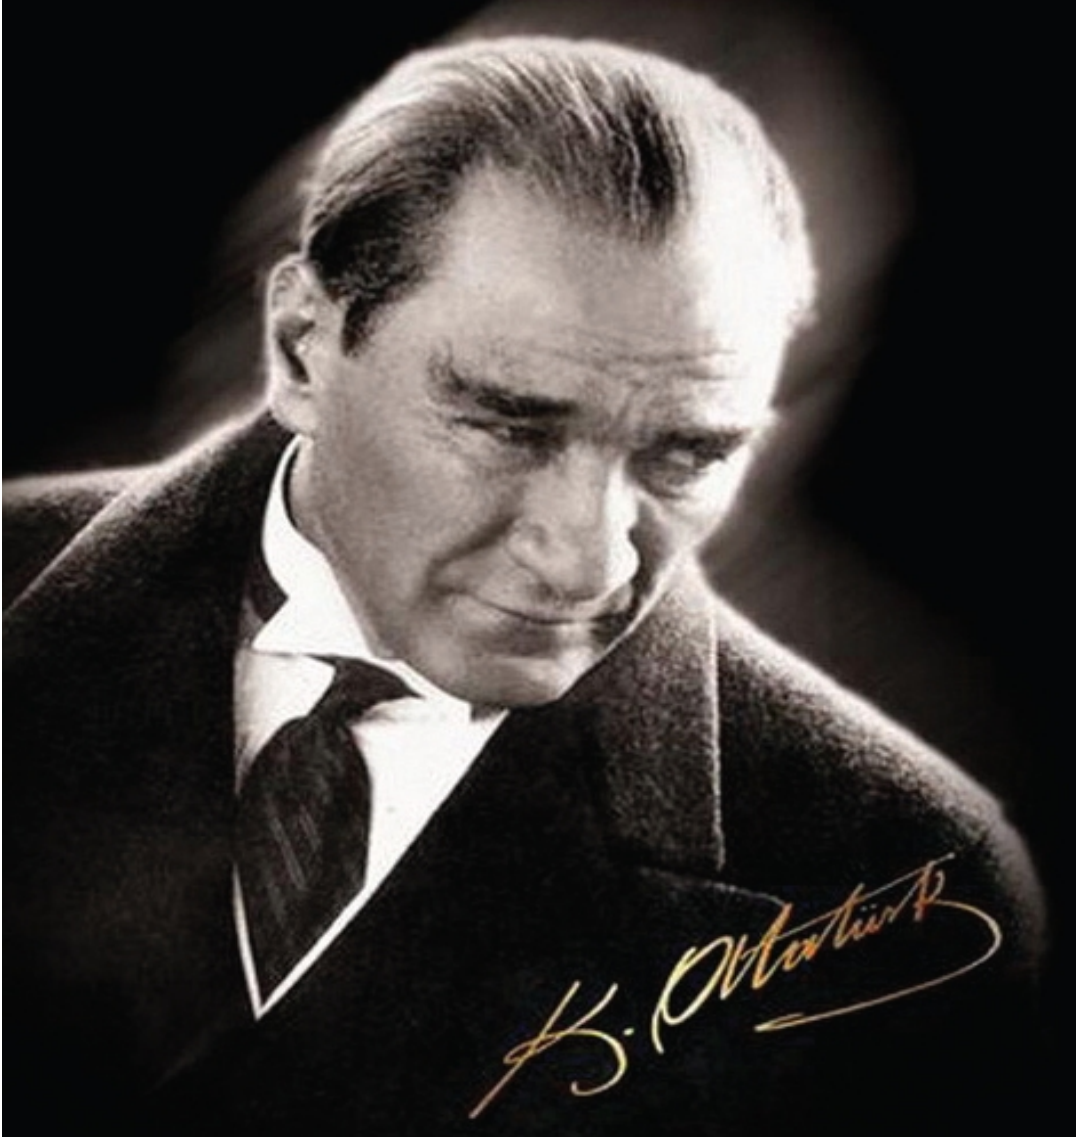

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

M. Kemal ATATÜRK

İÇİNDEKİLER

1- YÖNETİCİ ÖZETİ

Yönetici Özeti	1
----------------	---

2-GENEL DEĞERLENDİRME

2.1 Misyon ve Vizyon	3
2.2 Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	4
2.3 Kuruluşun Yatırımlarının Finans Kaynakları	11
2.4 Kırklareli Üniversitesi Fiziki Kapasitesi	12
2.5 2016 Yılı Gerçekleşen Fiziki Kapasite Artışı	18
2.6 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları	19
2.7 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	20

3-2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

3.1 Eğitim Yükseköğretim Projeleri	21
3.2 Eğitim-Beden Eğitimi Spor Projeleri	31
3.3 Yayın Alımları	36
3.4 Kamulaştırma İşlemleri	36

4-ÖNERİLER

Öneriler	37
----------	----



2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine çağın gerekliliklerine uygun yeni yaklaşımlar getirilmiştir. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun bir şekilde elde edilmesi ile belirlenmiş amaçlar doğrultusunda harcanması, değerlendirilmesi ve hesap verilebilirliğini sağlamak üzere çeşitli raporların hazırlanması, idarelerin gerçekleştirdikleri iş ve işlemler ile harcamalarının ve verimliliklerinin kontrol edilmesini temin maksadı ile ilgili kurumlara ve kamuya duyurulması kamu yönetimindeki çağdaş yaklaşım örneklerinden birini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz 2015-2016 eğitim ve öğretim döneminde toplam 22.676 öğrencisi, 677 akademik personeli, 7 yabancı uyruklu akademik personeli, 280 idari personeli, 5 sözleşmeli olmak üzere toplam 964 personeli ile 10 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, 14 araştırma uygulama merkezi, sürekli eğitim merkezi, uzaktan eğitim merkezi, Rektörlüğe bağlı 1 bölüm ile 7 yerleşkede eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanlarında çalışmalarını etkin olarak sürdürmektedir.

Kamu yatırımları içinde üniversitelere ayrılan payda eğitim ve spor sektöründe Üniversitemize 2016 yılı yatırımları için toplam 25.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Üniversiteler çağdaşlaşmada öncü, özgür düşüncelerin yaratıcı düşüncülere dönüştürüldüğü, ülke ve insanlık yararına olan bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı, evrensel değerlerin ulusal değerlerle bütünleştirilerek genç nesillere aktarıldığı kurumlardır. Üniversitemiz bilgiye ve kazanılan bilgilerin geliştirilmesi ile çeşitliliğini arttıracak araştırma ve geliştirme projelerinin ivme kazandırılarak arttırılmasına büyük önem vermektedir.

Misyonu “Bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, yaymayı, paylaşmayı ve uygulamayı evrensel boyutlara taşımak; bilimsel, teknolojik ve kültürel birikime katkıda bulunmak; yaratıcı, sorgulayıcı, araştırmacı, katılımcı, liderlik vasıflarına sahip, işine kendini adanmış, en yüksek ahlaki değerlerle donatılmış, sosyal sorumluluğa sahip, yetkin ve özgüven sahibi insanlar yetiştirerek Türk toplumunun ve insanlığın refah ve mutluluğuna katkıda bulunmak”, vizyonu ise “Öğretim ve araştırma kalitesiyle fırsatları gören, geleceği şekillendirme noktasında özgün bilgi üreten öncü üçüncü nesil bir yükseköğretim kurumu olmak” olan Üniversitemiz gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda



öğrencilerimize en mükemmel eğitim-öğretim imkânını sunmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda fiziki mekân ve alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitemizin 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR

Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1 Misyon ve Vizyon

Misyon

Bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, yaymayı, paylaşmayı ve uygulamayı evrensel boyutlara taşımak; bilimsel, teknolojik ve kültürel birikime katkıda bulunmak; yaratıcı, sorgulayıcı, araştırmacı, katılımcı, liderlik vasıflarına sahip, işine kendini adanmış, en yüksek ahlaki değerlerle donatılmış, sosyal sorumluluğa sahip, yetkin ve özgüven sahibi insanlar yetiştirerek Türk toplumunun ve insanlığın refah ve mutluluğuna katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Öğretim ve araştırma kalitesiyle fırsatları gören, geleceği şekillendirme noktasında özgün bilgi üreten öncü üçüncü nesil bir yükseköğretim kurumu olmaktır.





2.2 Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:

➤ **ETKİN VE VERİMLİ BİR KURUMSAL YAPININ OLUŞTURULMASI**

Bu stratejik alanın temel amacı, akademik ve idari yapılanmanın Üniversitenin ihtiyaçları göz önüne alınarak nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesidir. Bu temel amaca ulaşmaya yönelik orta vadeli ölçülebilir hedef ve faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

AMAÇLAR:

İDA-A1: Üniversitemizin yapılanma ve işleyişine yönelik ihtiyaçlarının giderilmesi.

HEDEFLER

İDA-A1H1: Fiziki altyapı eksikliklerinin giderilmesi.

İDA-A1H2: İdari birimlerin işlerlik ve verimliliğinin artırılması.

İDA-A1H3: Üniversitemizdeki eğitim-öğretimin teknokent veya kosgeb gibi oluşumlar vasıtasıyla teknoloji ile iç içe gelişmesini sağlamak.

STRATEJİLER

İDA-A1S1: Akademik ve idari birimlerin insan kaynakları bakımından iş ve işlemlerinin değerlendirilmesi.

İDA-A1S2: Akademik ve İdari personelin nitelik ve nicelik olarak daha verimli bir düzeye ulaştırılması için gerekli standartların belirlenerek düzenlemelerin yapılması.

İDA-A1S3: Akademik ve İdari personelin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için açılacak kurs ve seminerlere yönlendirilmesi.

İDA-A1S4: Tekno-kent veya kosgeb merkezleri kurulabilmesi için gerekli bütün işbirliği olanaklarının geliştirilmesi ve kullanılması.

FAALİYETLER / PROJELER

İDA-A1H1F1: Derslik ve eğitim alanlarının sayısının artırılması.

İDA-A1H1F2: Sosyal aktivite alanlarının sayısının artırılması.

İDA-A1H1F3: İşitsel ve görsel teknolojik kaynakların sayısının artırılması.

İDA-A1H2F1: İdari personelin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan alanlarda kurs ve seminerler düzenlenmesi.

İDA-A1H3F1: Kosgeb merkezi kurulmasıyla ilgili olarak çalışmaların gerçekleştirilmesi.



PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGE TABLOSU						
İDA	FAALİYET/PROJE	2013	2014	2015	2016	2017
A1H1F1	Derslik ve eğitim alanlarının sayısının artırılması	250	275	285	300	325
A1H1F2	Sosyal aktivite alanlarının sayısının artırılması	37	42	45	47	50
A1H1F3	İşitsel ve görsel teknolojik kaynakların sayısının artırılması	1600	1650	1700	1750	1800
A1H2F1	Düzenlenen kurs ve seminer sayısı	2	2	2	2	2
A1H3F1	Kosgeb merkezinin kurulması	1				

➤ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

Bu stratejik alanın temel amacı çağdaş, nitelikli, verimli ve model oluşturabilecek bir eğitim anlayışının ve bunun için gerekli altyapının kurulması ve geliştirilmesidir. Bu temel amaca ulaşmaya yönelik orta vadeli ölçülebilir amaç, hedef ve faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

AMAÇLAR:

EĞT-A1: Modern, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli ve verimli bir eğitim-öğretim anlayışını gerçekleştirmek.

HEDEFLER

EĞT-A1H1: Öğretim elemanlarının modern eğitim teknolojilerinden yararlanma imkân ve becerilerinin artırılması.

EĞT-A1H2: Ders müfredatlarının ve içeriklerinin modern eğitimin gerekleri doğrultusunda gözden geçirilmesi ve gerekli görülenlerin güncellenmesi.

EĞT-A1H3: Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliklerinin artırılması.

STRATEJİLER

EĞT-A1S1: Etkinlik gereksinimi için anket düzenlenmesi.

EĞT-A1S2: Kurum içinde yukarıda belirtilen becerilere yönelik eğitim verebilecek personelin saptanması; gerekli durumda kurum dışından destek sağlanması.

EĞT-A1S3: Eğitime uygun müfredat ve içeriğin hazırlanması için gerekli alt yapının oluşturulması.



EĞT-A1S4: Etkinliklerin eğitim-öğretim programında herhangi bir aksaklık meydana getirmeyecek şekilde planlanması.

FAALİYETLER / PROJELER

EĞT-A1H1F1: Öğretim elemanları için modern eğitim teknolojilerinin kullanımına yönelik seminerler düzenlenmesi.

EĞT-A1H2F1: Öğretim elemanlarının verdikleri derslerin planının (varsa metinlerini) ve kullandığı kaynakların güncellenmesi.

EĞT-A1H3F1: Erasmus, Farabi vb. çerçevesinde öğretim elemanı ve öğrenci değişiminin yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunulması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGE TABLOSU						
EĞT	FAALİYET/PROJE	2013	2014	2015	2016	2017
A1H1F1	Eğitim teknolojilerinin kullanımına yönelik düzenlenen seminer sayısı	3	3	3	3	3
A1H2F1	Güncellenen ders planları ve kaynakların ders toplamına oranı	20%	40%	60%	80%	100%
A1H3F1	Erasmus programına katılan öğrenci sayısı	10	15	20	25	30
	Farabi programına katılan öğrenci sayısı	3	5	8	10	15
A1H3F1	Erasmus programına katılan öğretim elemanı sayısı	8	10	12	14	15
	Farabi programına katılan öğretim elemanı sayısı	1	3	4	5	5
A1H3F1	Değişim programlarının yaygınlaştırılmasına yönelik etkinlik sayısı	2	2	2	2	2

➤ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN GELİŞTİRİLMESİ

Bu stratejik alanın temel amacı, üretilen bilimsel araştırma ve yayınların ulusal ve uluslararası düzeye uygun olarak geliştirilmesi ve sayılarının arttırılmasıdır. Bu temel amaca ulaşmaya yönelik orta vadeli ölçülebilir hedef ve faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

AMAÇLAR:

ARŞ-A1: Bilimsel ve akademik araştırma, yayın ve projelerin ulusal ve uluslararası düzeye uygun olarak geliştirilmesi ve sayılarının arttırılması.



HEDEFLER

ARŞ-A1H1: Ulusal ve uluslararası indekslere girebilecek koşullara sahip süreli yayınların çıkarılması.

ARŞ-A1H2: Disiplinler arası ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve desteklenmesi.

STRATEJİLER

ARŞ-A1S1: Ulusal ve Uluslararası indekslerce aranan koşulların duyurulması.

ARŞ-A1S2: Birimlerin ortak çalışma alanlarını belirlemeleri.

ARŞ-A1S3: Ortak çalışma alanlarına yönelik proje ve etkinlik (kongre, sempozyum, konferans, panel, vs.) taslaklarının oluşturulması.

ARŞ-A1S4: Ulusal ve uluslararası akademik yayınların burs ve ödül başvuru koşullarının belirlenmesini ve periyodik olarak öğretim elemanlarına duyurulmasını sağlamak.

FAALİYETLER / PROJELER

ARŞ-A1H1F1: Ulusal ve uluslararası indekslere girebilecek koşullara sahip akademik araştırma, yayın ve projelerinin sayısının artırılması

ARŞ-A1H1F2: Üniversitemiz bünyesinde ulusal ve uluslararası indekslere girebilecek süreli yayınların çıkarılmasının sağlanması.

ARŞ-A1H1F3: Ulusal ve uluslararası akademik yayınlara burs ve ödül başvuru koşullarının periyodik olarak öğretim elemanlarına duyurulması.

ARŞ-A1H2F1: Disiplinler arası çalışmalara yönelik faaliyetler yapılması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGE TABLOSU						
ARŞ	FAALİYET/PROJE	2013	2014	2015	2016	2017
A1H1F1	İndekslere girebilecek araştırma, makale, yayın sayısı	400	420	440	460	480
A1H1F2	Üniversitemiz bünyesinde çıkarılan süreli yayın sayısı	2	3	4	5	6
A1H1F3	Yayınlara ilişkin ödül başvuru koşullarının duyurulma sayısı	1	1	1	1	1
A1H2F1	Disiplinler arası çalışmalara yönelik etkinlik sayısı	2	2	3	3	4



➤ KAYNAK GELİŞTİRME

Bu stratejik alanın temel amacı, mevcut kaynakları geliştirmek ve yeni kaynaklar yaratmaktır. Bu temel amaca ulaşmaya yönelik orta vadeli ölçülebilir hedef ve faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

AMAÇLAR:

KYN-A1: Üniversitenin mevcut kaynaklarını geliştirmek ve yeni kaynaklar yaratmak.

HEDEFLER

KYN-A1H1: Üniversiteye kaynak (fon, bağış ve sponsor) sağlanması.

STRATEJİLER

KYN-A1S1: Mevcut kaynakların verimlilik potansiyeline işlerlik kazandırılması.

KYN-A1S2: Üniversiteye kaynak sağlayabilecek kişi, kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler içinde olunması.

KYN-A1S3: Yeni kaynak oluşturma konusunda öneri akışını sağlayacak bir ortamın oluşturulması.

KYN-A1S4: Kaynakların daha verimli kullanımının teşvik edilmesi.

FAALİYETLER / PROJELER

KYN-A1H1F1: Birimlerde ‘intranet’ benzeri kurumsal elektronik iletişim ağı kurularak, iletişim ve dosya/klasör transferinin daha kolay ve verimli hale getirilmesi.

KYN-A1H2F1: Kaynak sağlayabilecek kişi, kurum ve kuruluşların belirlenmesi.

KYN-A1H2F3: Yeni kaynak oluşturma ve bulma konusunda paydaşların önerilerini belirleyecek bir araştırmanın/anketin yapılması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGE TABLOSU						
KYN	FAALİYET/PROJE	2013	2014	2015	2016	2017
A1H1F1	İntranet benzeri kurumsal iletişim ağı kurulması			1		
A1H1F2	Kaynak sağlayacak kişi ve kurumların belirlenmesine ilişkin toplantı sayısı	1	1	1	2	2
A1H1F3	Yeni kaynak sağlamaya yönelik paydaş anket sayısı	1	1	1	1	1



➤ İŞBİRLİKLERİ VE KURUMSAL İMAJ

Bu stratejik alanın temel amacı, ulusal ve uluslararası işbirliği olanaklarıyla kurumsal imajın geliştirilmesidir. Bu temel amaca ulaşmaya yönelik orta vadeli ölçülebilir hedef ve faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

AMAÇLAR:

İMJ-A1: Üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanınırlık ve saygınlığını daha da güçlendirmek.

HEDEFLER:

İMJ-A1H1: Her birimin ilgi alanında yılda en az bir bilimsel ve toplumsal etkinlik gerçekleştirmesini sağlamak.

İMJ-A1H2: Her birimin yılda en az bir ulusal ve bir uluslararası bilimsel toplantıya bir bildiri ile katılmasını sağlamak.

İMJ-A1H3: KLÜ Araştırma fonuna götürülen proje önerisi sayısını artırmak.

İMJ-A1H4: Tüm birimler için mezun takip sisteminin oluşturulması.

İMJ-A1H5: Birimlerin kamu kurum ve kuruluşları, iş çevreleri, STK'lar ile diğer ulusal ve uluslararası üniversiteler ile işbirliği yapmak.

STRATEJİLER

İMJA1S1: Bilimsel ve toplumsal etkinlikleri gerçekleştirmeyi özendirici yöntem ve uygulamalar geliştirmek.

İMJA1S2: Ulusal ve uluslararası toplantılara katılımın artırılması için özendirici yöntem ve uygulamalar geliştirmek.

İMJA1S3: Araştırma projelerini oluşturmayı özendirici yöntem ve uygulamalar geliştirmek.

İMJA2S1: mezun takip sisteminin oluşturulması, bunun birimlerce istihdam amacıyla kullanılmasının sağlanması ve imaja yansıtılması.

İMJA3S1: Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, STK'lar ve ilgili iş gruplarıyla işbirliği geliştirmek.

FAALİYETLER / PROJELER

İMJ-A1H1F1: Her bölümün ilgi alanında yılda en az bir bilimsel / toplumsal etkinlik gerçekleştirmesi.



İMJ-A1H2F1: Ulusal ve uluslararası yayın yapmanın ve bilimsel faaliyetlere, toplantılara katılımın artırılması.

İMJ-A1H3F1: Araştırma projelerini oluşturmayı özendirici yöntem ve uygulamaları geliştirmeye yönelik toplantılar düzenlemek.

İMJ-A1H4F1: Tüm birimler için mezuniyet sonrası takip sisteminin tasarlanması ve uygulamanın başlatılması.

İMJ-A1H5F1: İşbirliği yapılacak kurumları belirlemek ve görüşmelere başlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGE TABLOSU						
İMJ	FAALİYET/PROJE	2013	2014	2015	2016	2017
A1H1F1	Gerçekleştirilen bilimsel /toplumsal etkinlik sayısı	250	262	275	288	300
A1H2F1	Ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyet ve toplantılara katılan öğretim elemanı sayısı	40	45	50	55	60
A1H3F1	Araştırma projelerini geliştirmeye yönelik toplantı sayısı	1	1	1	1	1
A1H4F4	Mezuniyet takip sisteminin kurulması			1		
A1H5F1	İşbirliği yapılan ulusal ve uluslararası üniversite sayısı	30	35	40	45	50



2.3 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Üniversitemiz finansman kaynaklarını 2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını “...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...”, 2547 sayılı yasanın 46'ncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7'nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılâtın %5'ten az olmamak üzere elde edilen gelirleri, elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26'ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dâhil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, bankalarda tutulacak nakitlerden elde edilen faiz gelirleri olarak sayabiliriz.



KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

(1.000 TL)

SEKTÖR	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	PROGRAM YILI BÜTÇE ÖDENEK VE KAYNAKLAR				
			ÖZEL BÜTÇE		DÜŞÜLEN ÖDENEK	EKLENEN ÖDENEK	TOPLAM
			HAZİNE	ÖZ GELİR			
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM	2016H033060	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	100				100
	2009H031670	Kampus Altyapısı	2.500				2.500
	2016H033070	Muhtelif İşler	7.000			2.200	9.200
	2015H033000	Yayın Alımları	600				600
	2009H031680	Derslikler ve Merkezi Birimler	12.800		2.200		10.600
	2009H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000				2.000
		TOPLAM	25.000				25.000

2.4 Kırklareli Üniversitesi Mevcut Fiziki Alan Kapasitesi

Kırklareli Üniversitesi Kırklareli şehir merkezinde 3, ilçelerde 4 olmak üzere toplam 7 yerleşke üzerinde faaliyete geçmiş 8 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul 8 meslek yüksekokulu, 14 uygulama ve araştırma merkezi ve Rektörlüğe bağlı bir bölüm ile hizmet vermektedir. Ayrıca 2 fakülte, 1 yüksekokul ve 1 Devlet Konservatuvarının da faal hale getirilmesi çalışmaları devam etmektedir.


Kırklareli Üniversitesi mülkiyet durumuna göre tapulu ve tahsisli arsa/arazi miktarı toplam 3.959.776,33 m², bina/tesis miktarı ise 145.997 m²'dir.



ENSTİTÜ, FAKÜLTE, YO, MYO, SMYO VE TÜM BİRİMLER	Kampus Alanı	Kapalı Alan	Açık Spor Alanı
Yeni Kampüs Alanı	3.385.087,00	81.940,00	18.652,00
Rektörlük	10.000,00	5.400,00	
Kavaklı Yerleşkesi	237.616,00	21.141,00	3.690,00
Kırklareli Teknik Bilimler M.Y. O	40.850,00	8.655,00	1.860,00
Pınarhisar M.Y.O	8.501,00	2.627,00	550,00
Vize M.Y.O	15.254,00	8.030,00	-
Lüleburgaz M.Y. O	153.100,00	12.490,00	550,00
Babaeski M.Y.O	94.925,47	5.913,00	110,00
TOPLAM	3.959.776,33	145.997,00	25.412,00

Ayrıca üniversitemizin 25 yıllık gelişim planı hazırlanmış olup bu plana uygun olarak ihtiyaçlarımızı önceliklendirmek suretiyle fiziki mekânlarımızın kapasite arttırım çalışmaları devam etmektedir.

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKE PLANI

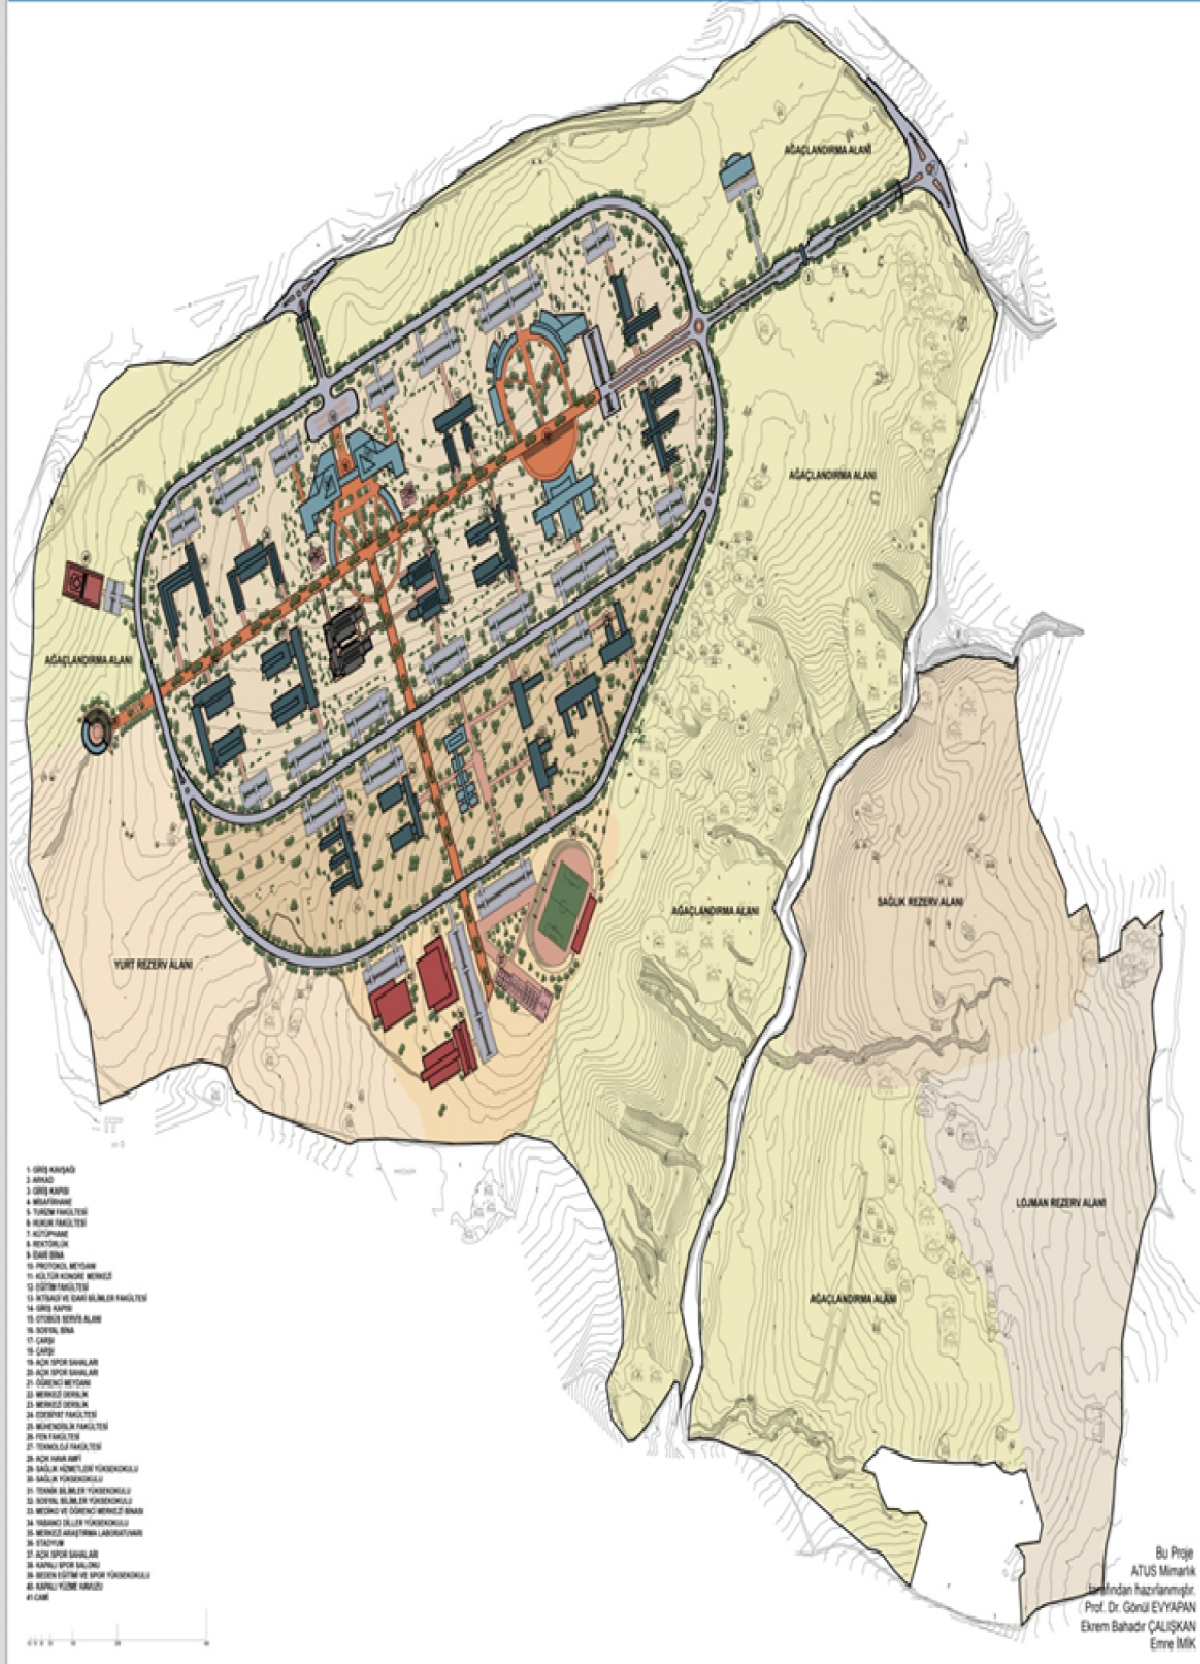

1. ÖĞRETİM BİNASI
2. ARKAD
3. ÖĞRETİM BİNASI
4. MÜHÜRBAĞ
5. TÜRKÇE FAKÜLTESİ
6. İKTİSADİ FAKÜLTESİ
7. AĞAÇLANDIRMA
8. REKTÖRLÜK
9. DİĞER BİNA
10. PROFESÖR BEDEKİ
11. KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ
12. ÖZGÜR FAKÜLTESİ
13. İSTİSNA VE DİĞER BİNALAR KAMPUS
14. ÖĞRETİM BİNASI
15. ÖZGÜR BİNASI
16. SORUMLU BİNA
17. ÇARŞI
18. ÇARŞI
19. AÇIK İPÇEK SAĞALLAR
20. AÇIK İPÇEK SAĞALLAR
21. ÇİĞİRCİ BEDEKİ
22. MERKEZ DİĞİTALİZASYON
23. MERKEZ DİĞİTALİZASYON
24. ÇİĞİRCİ FAKÜLTESİ
25. MÜHÜRBAĞ FAKÜLTESİ
26. FEN FAKÜLTESİ
27. TIBBİ FAKÜLTESİ
28. AÇIK İPÇEK SAĞALLAR
29. SAĞLIK MERKEZLERİ YÖNENKİLLİ
30. SAĞLIK YÖNENKİLLİ
31. TIBBİ FAKÜLTESİ YÖNENKİLLİ
32. SORUMLU BİNA YÖNENKİLLİ
33. MÜHÜRBAĞ ÇİĞİRCİ MERKEZİ BİNA
34. İKTİSADİ BİNA YÖNENKİLLİ
35. MERKEZ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
36. FAKÜLTESİ
37. AÇIK İPÇEK SAĞALLAR
38. KAPALI İPÇEK SAĞALLAR
39. SORUMLU BİNA YÖNENKİLLİ
40. KAPALI FAKÜLTESİ
41. ÇARŞI

Bu Proje
ATUS Mimark
tarafından hazırlanmıştır.
Prof. Dr. Gözül EYİPAK
Ekrem Bahadır ÇALIŞKAN
Emre İMİK



Üniversitemizde 198 öğretim üyesi, 197 öğretim görevlisi, 33 okutman ve 226 araştırma görevlisi, 13 Uzman olmak üzere kadrolu olarak toplam 667 akademik personel bulunmaktadır. Ayrıca 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince Üniversitemizde görevlendirilen 2 Profesör 5 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 1 Okutman olmak üzere 678 akademik personel görev yapmaktadır. 17 akademik personelimiz ise yine aynı kanun hükümlerine göre diğer üniversitelerde görevlendirilmişlerdir.

AKADEMİK PERSONEL					
	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	18	35	53	53	-
Doçent	21	69	90	90	-
Yrd. Doçent	159	56	215	215	-
Öğretim Görevlisi	197	53	250	250	-
Okutman	33	30	63	63	-
Çevirici	0	1	1	1	-
Eğitim- Öğretim Planlamacısı	0	1	1	1	-
Araştırma Görevlisi	226	81	307	307	-
Uzman	13	6	19	19	-

Üniversitemizde GİH sınıfında 207, SH sınıfında 9, THS 43, AHS sınıfında 2, YHS sınıfında 19 olmak üzere toplam 280 idari personel çalışmaktadır



İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE)

	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	207	153	360
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	9	8	17
Teknik Hizmetleri Sınıfı	43	38	81
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	0	2
Din Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Yardımcı Hizmetli Sınıfı	19	25	44
Sözleşmeli 4/b	-	-	-
Toplam	280	224	504

Üniversitemizin derslik ve eğitim alanları aşağıdaki tabloda gösterilmiş bulunmaktadır.

Eğitim Alanı	Kapasitesi 0-50	Kapasitesi 51-75	Kapasitesi 76-100	Kapasitesi 101-150	Kapasitesi 151-250	Kapasitesi 251-Üzeri
Amfi	-	5	41	3	-	-
Sınıf	41	120	21	-	-	-
Bilgisayar Lab.	17	6	-	-	-	-
Diğer Lab.	18	5	-	-	-	-
Toplam	76	136	62	3	-	-



	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Kapalı Spor Tesisleri	4	7082,50
Açık Spor Tesisleri	7	15.935,00
Toplam	11	23.017,50

	Sayısı (Adet)	Alanı (m2)	Kapasitesi
Öğrenci Yemekhanesi	9	3.375,47	2050
Personel Yemekhanesi	2	567,00	240
Toplam	11	3.942,47	2090

	Sayısı (Adet)	Alanı (m2)
Öğrenci Kantini	9	2.602,93
Kafe-Pastane	1	56,00
Toplam	10	2.658,93

Üniversitemizin 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde mevcut öğrenci sayısının okul ve eğitim sürelerine göre dağılımı aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.



Öğrenci Sayıları									
Birim Adı	I. Öğretim			II. Öğretim			Toplam		Genel Top.
	E	K	Top.	E	K	Top.	K	E	
Enstitüler	355	293	648	55	12	67	305	410	715
Fakülteler	2.321	2.530	4.851	1.263	1.502	2.765	4.032	3.584	7.616
Yüksekokullar	406	1.165	1.571	211	415	626	1.580	617	2.197
Meslek Yüksekokulları	5.975	4.338	10.313	3.229	1.755	4.984	6.093	9.204	15.297
Toplam	9057	8.326	17.383	4.758	3.684	8.442	12.010	13.815	25.825

Yabancı Öğrenci Sayıları			
	Bölümü		
	Erkek	Kadın	Toplam
Enstitüler	1	2	3
Fakülteler	78	148	226
Yüksekokullar	93	28	121
Meslek Yüksekokulları	99	163	262
Toplam	271	341	612

2.5 2016 Yılında Gerçekleşen Fiziki Kapasite Artışı:

2016 Yılında Derslikler ve Merkezi Birimler projesi kapsamında Kayalı Merkez Kampüsünde 30.567 m2 kapalı alana sahip III. Merkezi Derslik Binası inşaatı ve 15.200 m2 kapalı alana sahip Merkezi Kütüphane Binası inşaatlarının programa alınması hedeflenmiş olmakla birlikte 2016 yılı yatırım programında sadece Merkezi Kütüphane Binası inşaatı yer almış bulunmaktadır. Ancak üniversitemizde gerek yeni fakülte ve eğitim birimlerimizin açılması ve gerekse de mevcut eğitim birimlerimizde yeni açılan bölüm ve programlarımız



nedeniyle artan öğrenci sayımız dikkate alınarak programda mevcut olan Merkezi Kütüphane yerine III. Merkezi Derslik Binasının alınmasına karar verilmiş olup Kalkınma Bakanlığımızdan yatırım programımızda bu yöne revizyon talep edilmiştir.

Revizyon talebimizin Kalkınma Bakanlığımızca incelenerek kabulüne karar verilmiştir. Ancak inceleme ve kabul süreci uzun sürmüş olup revizyon talebimizin kabul edildiği bilgisi 15.11.2016 tarihinde üniversitemize ulaşmıştır. Bu nedenle ihaleye çıkılamamış olup proje kapsamında herhangi bir faaliyet yapılamamıştır.

Üniversitemiz yatırım programı içerisinde yer alan ve 2016 yılı için 100.000 TL ödenek tahsis edilmiş bulunan Etüt-Proje kapsamında Merkez Kayalı yerleşkesinde bulunan mevcut açık futbol sahasına ilave tribün yapım ve tribün kapatma projeleri yaptırılarak ihaleye hazır hale getirilmiştir.

Kampüs Altyapısı projesi kapsamında ise 2016 yılı içerisinde Vize Meslek Yüksekokulumuzun altyapı işleri ile Merkez Kayalı Kampüsünde iki adet sondaj kuyusu açılması ve su deposu yaptırılması işi ve Kampüs içi enerji nakil hattı ve Kayalı ile Kavaklı yerleşkelerine tanıtım panoları yaptırılarak hizmete alınmış bulunmaktadır.

2.6 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları:

GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU

(1.000 TL)

Sektör	Proje sayısı	Proje bedeli	Program yılı ödeneği	Eklenen	Bloke	Toplam serbest ödenek	Harcama	Nakdi Gerçekleşme Oranı *
Eğitim Yüksek-Öğretim	6	192.700	25.000			25.000	7.594	% 30

* Oran yılsonu serbest ödeneğe göre belirlenmiştir.

Ancak 2016 yılında harcanamayan devreden 14.900.000 TL öz gelir dikkate alındığında bu oran % 75 olarak hesaplanmaktadır.

2.7 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev ve sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını simgeleyen vizyonlarını oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır.

Anılan Kanunun “Kamu Yatırım Projeleri” başlıklı 25 inci maddesinde; “...Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir...” denilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Üniversitemiz 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda; kamu kaynaklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun ışığında etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin kaynakların kullanımında kamu idarelerine getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği bir takım aksaklıklarla karşılaşılabilir. Yatırım uygulamalarında karşılan sorunları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür;

Çok yıllık projelerin yılı ödeneklerinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanundaki yasal bekleme süreleri ihalelerin geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.

Proje ve kontrollük işlerini yürütebilecek; Mimar, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, şantiye ile büro arasındaki koordinasyonu sağlayacak olan teknikerlere ve mevcut birimlerin



acil ihtiyaçlarının giderilmesi için teknisyenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu personelin nitelikli ve deneyimli olması ise önem arz etmektedir.

Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden farklı olarak vize edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir.

Üniversitemiz 2016 yılı yatırım programında yer alan Merkezi Kütüphane yapılması işinden vaz geçilerek diğer kapalı alanlardan ihtiyacı karşılayabilecek bir merkezi kütüphane öğrencilerin ve akademisyenlerimizin kullanımına açılmış olup artan öğrenci sayımız ile birlikte meydana gelen derslik ihtiyacımızı karşılamak önemli önceliğimiz haline gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle Kalkınma Bakanlığımız ile mevcut Merkezi Kütüphane yapım işi yerine III. Merkezi Derslik İnşaatı yapılması amacıyla revizyon talep edilmiştir. Kalkınma Bakanlığımızca revizyon talebimiz bakanlığın 31.10.2016 tarih ve 88799753-100-00-4455 sayılı yazılarıyla kabul edilerek onaylandığı bildirilmiştir.

3. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

3.1 Eğitim Yükseköğretim Projeleri

PROJE NO : 2016H033060
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (Etüt-Proje)
PROJE YERİ : Kırklareli
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2016-2016

(1.000 TL)

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
100	100		100	56	% 56	

2016H033060 Proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işi kapsamında;

- Merkez Kayalı yerleşkesinde mevcut bulunan açık futbol sahasına ilave tribün yapılması ve tribünlerin üzerinin kapatılmasına ilişkin proje alım işi İzzettin Aslan'a ihale edilerek 44.604,00 TL ödenmiş bulunmaktadır.
- I. Merkezi Derslik ve Amfiler Binası çelik çatı projesi alım işi İpek Müteahhitlik firmasına yaptırılarak 11.800,00 TL ödenmiştir.





KAMPUS ALTYAPISI İNŞAATI İŞİ

PROJE NO : 2009H031670
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : KAMPÜS ALTYAPISI
(Yol, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Isı Şebekesi, Elk., Trafo)
PROJE YERİ : Kırklareli
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2017

(1.000 TL)

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
30.000	2.500		2.500	720	% 29	27.459

2009H031670 Proje numaralı Kampus Altyapısı işi kapsamında;

- Proje kapsamında Merkez Kayalı Kampüsüne iki adet sondaj kuyusu açılması ve su deposu yapılması işi Salih Zeki Çorbacıya ihale edilerek 196.938,33 TL ödenmiş ve iş bitirilmiştir.
- Üniversitemiz Vize Meslek Yüksekokulunun alt yapı işi Mohammed Rıza Attarıan'a ihale edilerek toplam 261.773,43 TL ödeme yapılmış ve iş bitirilmiştir.
- Merkez Kayalı yerleşkesi kampüs içi elektrik enerji hattı ve Kavaklı ile Kayalı yerleşkeleri tanıtım panosu yapım işi Karine Mühendislik Mimarlık İnşaat Gıda San. Ticaret Limited şirketine ihale edilmiş olup toplam 188.096,45 TL ödeme yapılarak iş bitirilmiş bulunmaktadır.
- Merkez Kayalı yerleşkesi giriş takı yapım işinin kesin hesabı yapılmış olup yüklenici firma Taş İnşaat Taahhüt Ticaret Limited şirketine 72.960,14 TL ödeme yapılmıştır.



Kayalı Kampüs Giriş Taki





MERKEZİ BİRİMLER VE DERSLİKLER İNŞAATI PROJESİ

PROJE NO	: 2009H031680
SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (30.567 m ²) inşaat
PROJE YERİ	: Kırklareli
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2009-2017

(1.000 TL)

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı	Kümülatif Harcama
		Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
150.000	12.800	2.200	10.600		% 0	109.496

2009H031680 proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler işi kapsamında;

- Bu proje kapsamında 2016 yılı içerisinde faaliyet yapılamamış bulunmaktadır. Ancak bu proje kapsamında yapımı bitirilen Rektörlük Binası ve Laboratuvar binaları hizmete açılarak kullanılmaya başlanmış bulunmaktadır.



I. Rektörlük İdare Binası



Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları



2016 yılı itibariyle merkez Kayalı Kampüsümüzde Mühendislik fakültemizin elzem ihtiyacı olan laboratuvar inşaatı bitirilerek faaliyete geçirilmiş bulunmaktadır. Söz konusu laboratuvarlar Gıda Bölümü, Elektrik-Elektronik Bölümü ve İnşaat Mühendisliği bölümü laboratuvarlarından müteşekkil bulunmaktadır.

Gıda Bölümü Laboratuvarı



Elektrik Elektronik Bölümü Laboratuvarı



Laboratuvar Binası İç Görünüşü



Gıda Bölümü Laboratuvarı



İnşaat Bölümü Laboratuvarı





MUHTELİF İŞLER PROJESİ

PROJE NO : 2016H033070
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : MUHTELİF İŞLER (B.Onarım +Mak. Teç. Bil. Alm. Yazılım)
PROJE YERİ : Kırklareli
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2016-2016

(1.000 TL)

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı	Kümülatif Harcama
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
7.000	7.000	2.200	9.200	6.224	% 68	

2016H032990 proje numaralı Muhtelif İşler kapsamında;

- Merkez Kayalı Kampüsü yerleşkesi Bayrak Direği yapılması ve muhtelif onarım işleri kapsamında toplam 178.980,67 TL harcama yapılmıştır.
- Üniversitemiz yerleşkelerinde muhtelif çatı büyük bakım ve onarımları kapsamında toplam 983.081,38 TL harcama yapılmıştır.
- Üniversitemiz muhtelif büyük bakım onarımları kapsamında ise 2016 yılsonu itibariyle toplam 1.041.451,98 TL harcama yapılmış bulunmaktadır.
- Diğer makine teçhizat alımları, okul ve büro mefruşat ve demirbaş alımları, bilgisayar alımları ve yazılımları ile taşıt alımları için tahsis olunan ödeneğin,

Büro ve okul mefruşatı alımları kapsamında;

-) 342.989,23 TL'lik kısmı ile büro mefruşatı
-) 52.241,55 TL'lik kısmı ile okul mefruşatı alımları

Bilgisayar alımları kapsamında;

-) 757.619,00 TL'lik kısmı ile bilgisayar alımları

Makine ve teçhizat alımları kapsamında;

-) 1.645.195,91 TL'lik kısmı ile işyeri makine ve teçhizat alımları
-) 48.461,84 TL'lik kısmı ile diğer makine ve teçhizat alımları

Laboratuvar malzemeleri alımı kapsamında;



-) 994.511,20 TL'lik kısmı ile laboratuvar cihazları

Yazılım ve lisans alımları kapsamında;

-) 235.137,27 TL'lik kısmı ile bilgisayar yazılım alımları

-) 24.855,92 TL'lik kısmı ile lisans alımları

İşi yapılmıştır.

3.2 Eğitim-Beden Eğitimi Spor Projeleri

AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ

PROJE NO : 2009H050210
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (Bas. Vole. Fut.)
PROJE YERİ : Kırklareli
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2017

(1.000 TL)

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
5.000	2.000		2.000		% 0	2.580

2009H050210 proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri işi kapsamında;

Bu proje kapsamında da 2016 yılı itibariyle faaliyette bulunulamamıştır. Ancak açık futbol sahası gece aydınlatması, Fitness spor salon inşaatı ve açık spor sahaları inşaatı 2015 yılsonu itibariyle bitirilerek 2016 yılı içerisinde hizmete alınmış bulunmaktadır. 2017 yılı içerisinde açık futbol sahasının tribünlerinin üzeri kapatılarak ilave tribün inşaatı yaptırılacaktır.



Merkez Kampus Açık Futbol Sahası Gece Aydınlatması




Fitness Spor Salonu İnşaatı



Fitness Spor Salonu İç Görünüş



Fitness Spor Salonu İç Görünüş

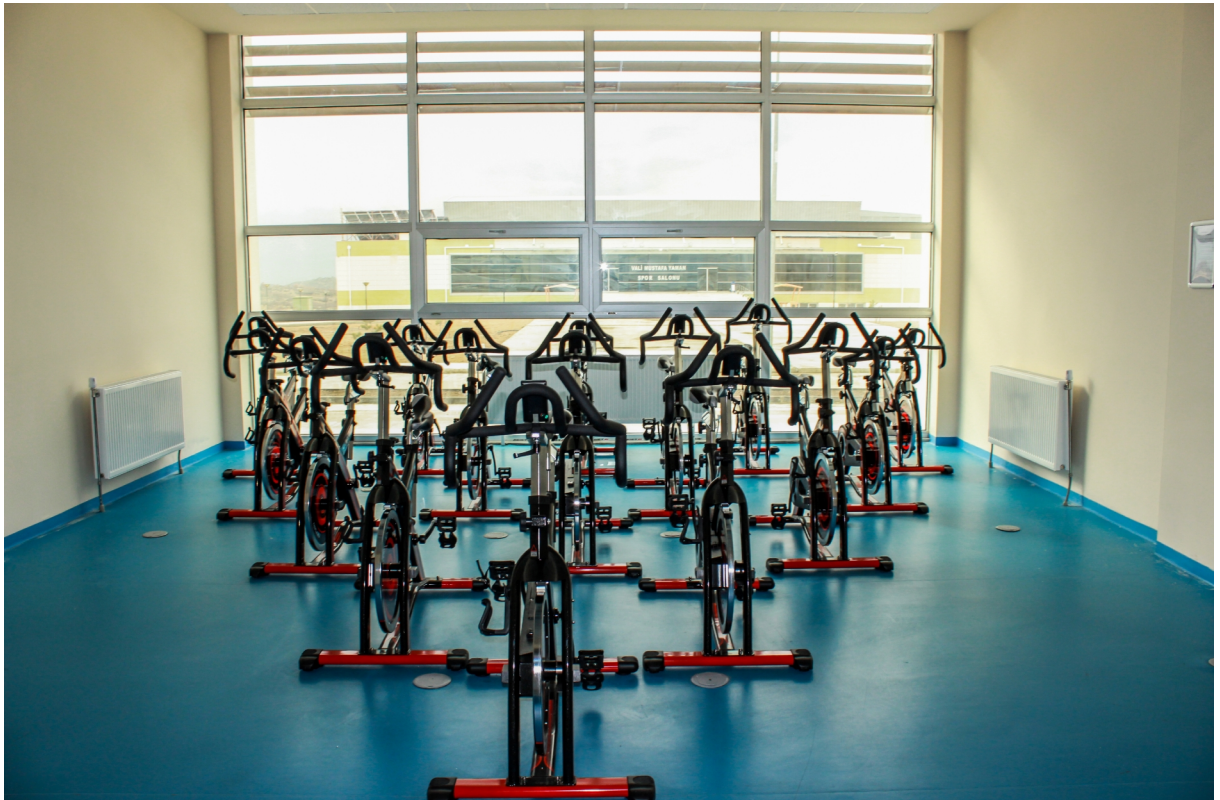



Açık Spor Sahaları





3.3 Yayın Alımları

PROJE NO : 2015H033000
SEKTÖRÜ : EĞİTİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Yayın Alımları
PROJE YERİ : KIRKLARELİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2015-2015

1.000 TL

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı	Kümülatif Harcama
		Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
600	600		600	594	% 99	

2016H033000 Proje numaralı Yayın alımları işi kapsamında;

- Basılı ve elektronik ortamda yayın alımı için tahsis olunan 600.000 TL'lik ödeneğin 52.794,47 TL'lik kısmı ile basılı yayın alımları 544.567,23 TL'lik kısmı ile ise elektronik ortamda yayın alım ve veri tabanı abonelikleri satın alınmıştır.

• 3.4 Kamulaştırma İşlemleri

Üniversitemizde 2016 yılı içerisinde kamulaştırma faaliyeti yapılmamıştır.

4. ÖNERİLER

Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun, mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz her geçen yıl değişen öncelik ve ihtiyaçlar temelinde kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer taraftan üniversitenin ihtiyaçlarına göre kısıtlı finansman kaynakları göz önünde bulundurulduğunda mali kaynakların artırılması konusunda Üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim ve bilimsel araştırma hizmet alanlarında üniversitenin topluma sunduğu katkının artması anlamına gelecektir.

Ödeneklerin artırılması kesinti, iptal ve blokelerin olmaması daha kaliteli hizmet vermek ve hedeflenen yatırımlardaki sapmaları önlemek açısından önem taşımaktadır.

Yatırım projelerinin bütçesinin tavan rakamlarına göre değil ihtiyaçların aciliyetine göre belirlenmesi daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.

İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen, Hazine Yardımından karşılanacak ödeneklerin, Ayrıntılı Finansman Programı ile 4 ayrı dilim halinde serbest bırakılması sebebiyle, ödenekler verimli kullanılamamakta, özellikle inşaat ile ilgili programlanan yatırımlar zamanında gerçekleştirilememektedir.

Ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılması, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracaktır.

Ülkemizin kalkınma plan ve programlarını hazırlama, izleme ve değerlendirme görevi verilen Kalkınma Bakanlığının öncülüğünde geliştirilecek hizmet içi eğitim programlarının Üniversitemiz açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

(BAKANLIĞI/MÜSTEŞARLIĞI/GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/BAŞKANLIĞI) 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ(*)
(Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.)

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA				2016 YILI PROGRAM ÖDENEK				2016 YILI REVİZE ÖDENEK				2016 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞME			
		Dış	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	
																			Dış
Tarım																			
Madencilik																			
İmalat																			
Enerji																			
Ulaştırma- Haberleşme																			
Turizm																			
Eğitim	6		192.700					138.815				25.000						7.594	
Sağlık																			
D.Kamu Hizm.																			
İktisadi																			
Sosyal																			
Toplam	6		192.700					138.815				25.000						7.594	

(*) Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe, Mahalli Katkı birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlanarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

2016 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL) DÖNEM=4

Kuruluş Adı : KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı: Eğitim

Birim No(1)	YSK(2)	Proje No(3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü(5)	Bitiş Yılı(6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış. (8)	Proje Tut. Toplamı(9)	2015Kümülatif Harcama(10)	Ödenek Dış Kredisi(11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplamı(13)	(+ / - (14))	Aktarma Miktl.(15)	Harcama Dış Kredisi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplamı(18)	
		2016H033060	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2016	Kırkareli	0	100		0	0	100					56	
		2016H033070	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2016	Kırkareli	0	7.000		0	0	7.000					6.224	
		2009H031670	Kampus Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2017	Kırkareli	0	30.000	26.739	0	0	2.500					720	
		2009H031680	Derslikler ve Merkez Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2018	Kırkareli	0	150.000	109.496	0	0	12.800					0	
		2009H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2017	Kırkareli	0	5.000	2.580	0	0	2.000					0	
		2016H033080	Yayın Alımları	ÖZEL BÜTÇE	2016	Kırkareli	0	600		0	0	600					594	
Toplamı							0	192.700	138.815	0	0	25.000						7.594
